

Budgetplanung Q4 2026

Projekt: Blueprint (Kunde: Northwind Logistics) | Projektnummer: PRJ-BLUEPRINT-2026 | Erstellt am: 08.09.2026 | Erstellt von: Tom Kessler (Projektverantwortlicher)

Dieses Dokument plant die verbleibenden Ausgaben des Projekts 'Blueprint' für Q4 2026 (Oktober bis Dezember), da nach der August-Rechnung nur noch 15.800 EUR des ursprünglichen Gesamtbudgets von 100.000 EUR zur Verfügung stehen. Ziel dieses Dokuments ist die Freigabe eines Nachtragsbudgets, da die geplanten Kosten das verbleibende Budget übersteigen.

Ausgangslage

Das Projekt 'Blueprint' befindet sich in der finalen Phase vor dem geplanten Go-Live im November 2026. Aufgrund eines erhöhten Testaufwands (siehe Rechnung DC-2026-0612 vom 04.09.2026) wurde das ursprüngliche Budget stärker als geplant beansprucht. Für Q4 2026 sind noch folgende Arbeitspakete offen: finale Integrationstests, Produktivsetzung sowie eine vierwöchige Hypercare-Phase nach Go-Live.

Geplante Kosten nach Gewerk (Q4 2026)

Gewerk	Geplante Kosten Q4	Verantwortlich
Externe Beratung (DevConsult, reduziert)	7.500,00 EUR	Tom Kessler
Interne Personalkosten (verrechnet)	4.200,00 EUR	Julia Berger
Testing & Qualitätssicherung	2.100,00 EUR	Sven Lorenz
Deployment & Hypercare (Go-Live-Begleitung)	1.200,00 EUR	Tom Kessler
Puffer für Unvorhergesehenes	800,00 EUR	Julia Berger

Summe geplante Kosten Q4 2026: 15.800,00 EUR

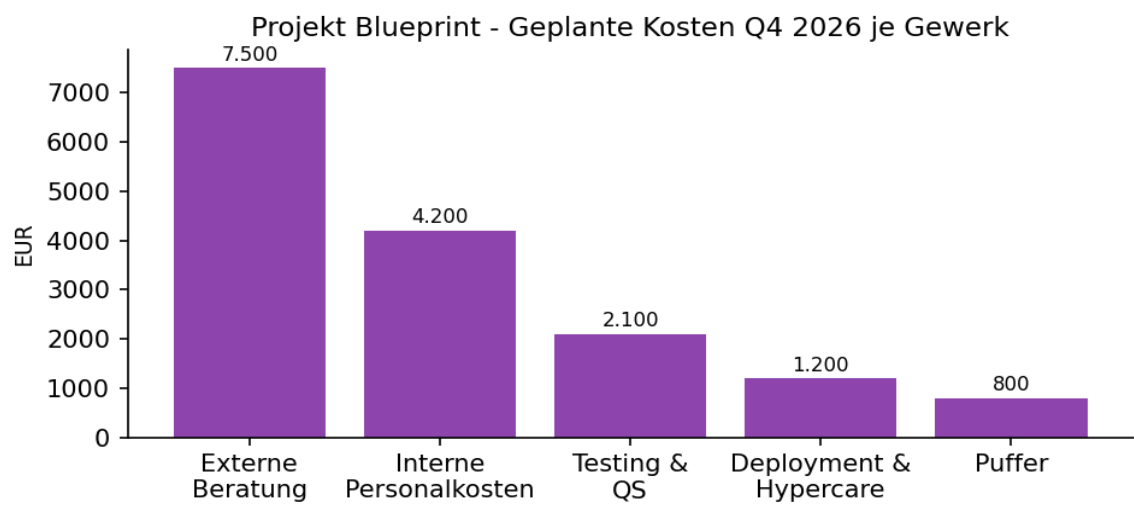


Abb. 1: Geplante Kosten für Q4 2026, aufgeteilt nach Gewerk.

Budget-Abgleich

Verbleibendes Budget nach August: 15.800,00 EUR. Geplante Kosten Q4: 15.800,00 EUR.
Rechnerisch ist das Budget damit exakt ausgeschöpft - ohne jeglichen Puffer für Verzögerungen oder Change Requests seitens Northwind Logistics. Erfahrungsgemäß entstehen in der Hypercare-Phase zusätzliche, ungeplante Aufwände von 10-15%.

Risiken

- Kein Puffer für zusätzliche Change Requests von Northwind Logistics vorhanden.
- Verzögerung des Go-Live-Termins würde automatisch zu einer Budgetüberschreitung führen, da Beratungstage tageweise abgerechnet werden.
- Hypercare-Phase historisch oft unterschätzt (siehe Erfahrungswerte aus Projekt 'Horizon' 2025).

Empfehlung & Freigabebedarf

Tom Kessler empfiehlt die Beantragung eines Nachtragsbudgets von 6.000 EUR (entspricht ca. 6% des Gesamtbudgets), um die genannten Risiken abzudecken, ohne den Go-Live-Termin zu gefährden.

Nächste Schritte

- Tom Kessler: Antrag auf Nachtragsbudget (6.000 EUR) bis 15.09.2026 bei der Finance-Abteilung einreichen.
- Julia Berger: Freigabe des Nachtragsbudgets in der nächsten Budget-Review-Runde beantragen.
